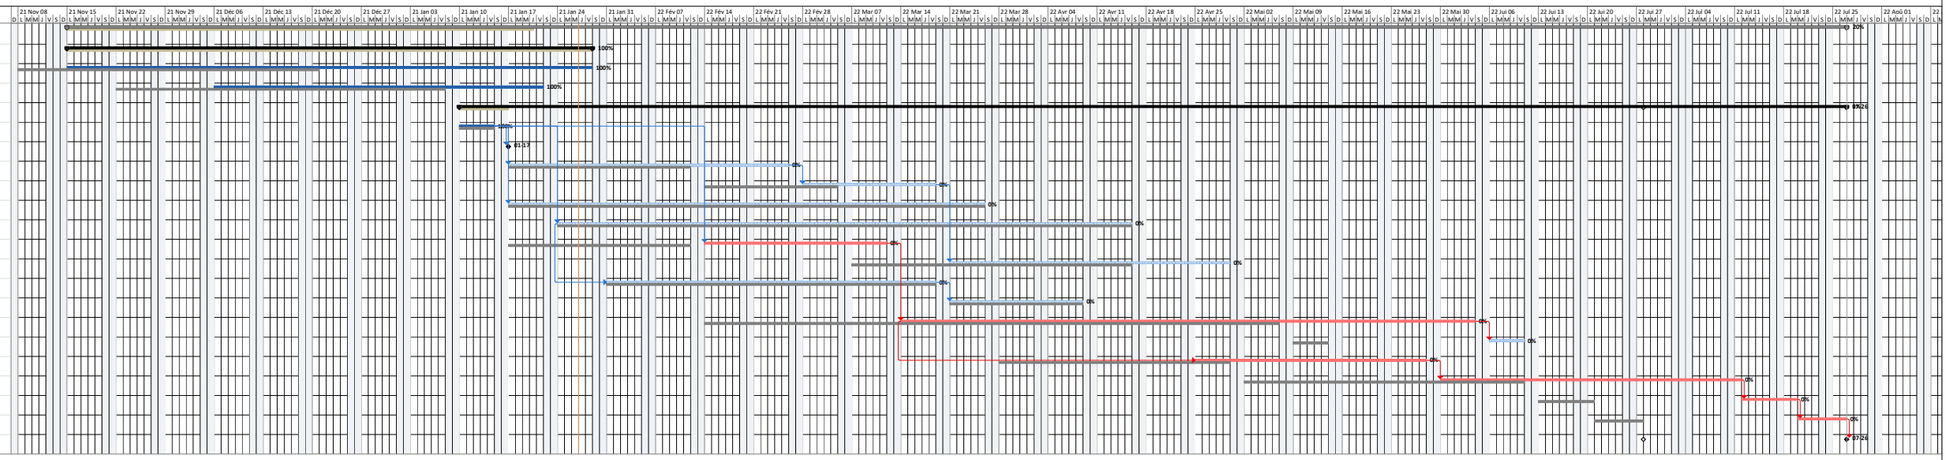N°	Texte1	% achevé	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
0		**20%**	**Quartier Exalt - Phase 2A au Lac-Beauport**	**181 jrs**	**Lun 21-11-15**	**Mar 22-07-26**
1		**100%**	**Travaux 2021**	**55 jrs**	**Lun 21-11-15**	**Ven 22-01-28**
2	Autorisation +5 jours	100%	Déboisement et broyage des souches	55 jrs	Lun 21-11-15	Ven 22-01-28
3	Autorisation +10 jour	100%	Déblai et évacuation de terre végétale	35 jrs	Lun 21-12-06	Ven 22-01-21
4		**1%**	**Travaux 2022**	**141 jrs**	**Lun 22-01-10**	**Mar 22-07-26**
5		100%	Déneigement (hors-délai)	5 jrs	Lun 22-01-10	Ven 22-01-14
6		100%	Reprise des travaux (17 janvier 2022)	0 jr	Lun 22-01-17	Lun 22-01-17
7	Impact début de 202	0%	Déblai et évacuation de terre végétale	30 jrs	Lun 22-01-17	Ven 22-02-25
8		0%	Déblai de 2e classe	15 jrs	Lun 22-02-28	Ven 22-03-18
9		0%	Nettoyage du roc	50 jrs	Lun 22-01-17	Ven 22-03-25
10		0%	Dynamitage rue et terrains (2 équipes de travaux)	60 jrs	Lun 22-01-24	Ven 22-04-15
11	Autorisation +20 jour	0%	**Pose des ponceaux Rue B et Chemin du Boisé (Date à valider selon émissior**	20 jrs	Lun 22-02-14	Ven 22-03-11
12		0%	Concassage des matériaux (selon conditions météo)	30 jrs	Lun 22-03-21	Ven 22-04-29
13		0%	Déblai et remblai du 1ere classe	35 jrs	Lun 22-01-31	Ven 22-03-18
14		0%	Déblai et remblai des bassins de rétention	15 jrs	Lun 22-03-21	Ven 22-04-08
15		0%	Pose de conduite incluant unité des bassins (début point bas rue B)	60 jrs	Lun 22-03-14	Ven 22-06-03
16		0%	Installation chambre de rétention (bassin #4)	5 jrs	Lun 22-06-06	Ven 22-06-10
17		0%	Voirie MG-112	25 jrs	Lun 22-04-25	Ven 22-05-27
18		0%	Voirie MG-20	30 jrs	Lun 22-05-30	Lun 22-07-11
19		0%	Bordure et régalage	6 jrs	Mar 22-07-12	Mar 22-07-19
20		0%	Préparation granulaires et pavage	5 jrs	Mer 22-07-20	Mar 22-07-26
21		0%	Fin des travaux	0 jr	Mar 22-07-26	Mar 22-07-26
